

Etat d'avancement des travaux de réouverture paysagère – printemps 2014

Réouvertures de points de vue remarquables

Col d'Ayens


(commune de Soulan)

Travaux réalisés en mai 2013

Débroussaillage et abattage : CFPPA



Avant travaux

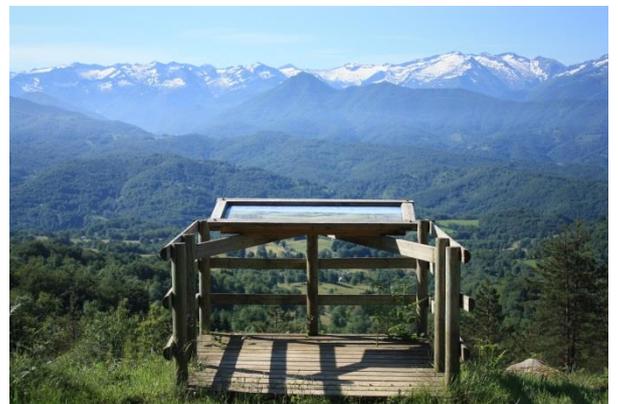

Après travaux

Col de Péguère - Tour Lafont

(communes de Boussenac/Sentenac de Sérou)

Travaux réalisés en octobre 2013, fin du chantier prévue pour le printemps 2014

Abattage et débroussaillage : CFPPA



La Tour Lafont retrouve de l'air


Col de la Crouzette (commune de Biert)

Travaux réalisés en octobre 2013

Abattage : CFPPA



Avant travaux

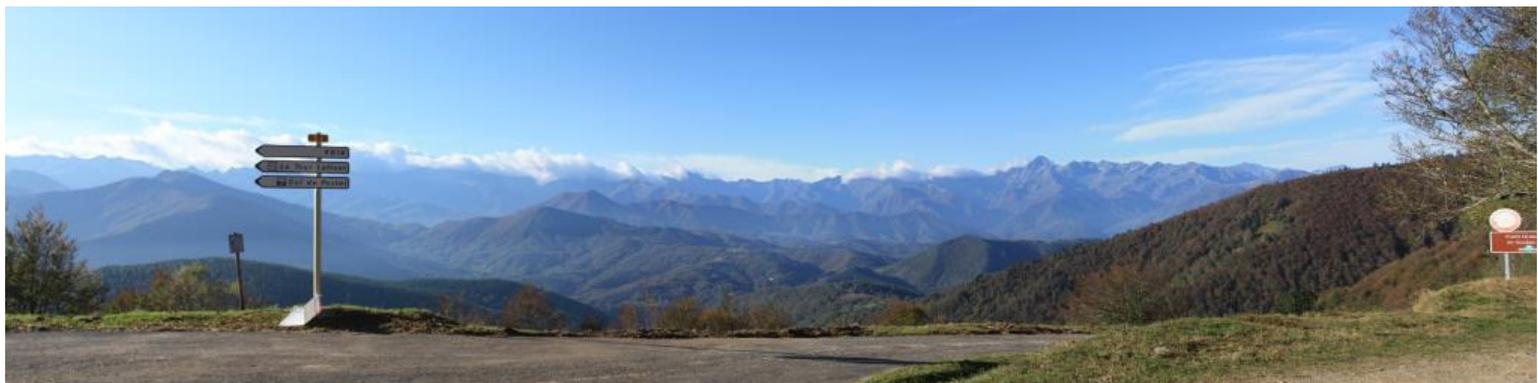

Après travaux

Réouvertures paysagères autour des villages

Commune d'Augirein

Objectifs

- Retrouver la vue entre le hameau de Terrefête et le bourg.
- Faire revenir le soleil sur le village et revoir le village depuis le chemin du Sarradech.

Réalisation des travaux

- 100% des propriétaires ont donné un avis favorable.

Calendrier prévisionnel

Février 2014 : 1^{ère} phase de travaux en chantier collectif et abattage débuté par les propriétaires en terrain privé.

Automne 2014 : 2^e phase de chantier collectif.
Intervention complémentaire du CFPPA.



Sur le chemin du Sarradech, au-dessus du village, une partie du débroussaillage a été réalisée (coupe des rejets de robiniers) et les chèvres devraient rapidement prendre le relais pour contenir les repousses.

Commune de Galey

Objectifs

- Retrouver la vue vers les montagnes depuis le chemin de croix et le calvaire.
- Réduire le risque incendie en dessous du village.

Réalisation des travaux

- 54 % des propriétaires font partie du chantier groupé, soit 46 % de la surface engagée dans le projet.

Calendrier prévisionnel

Automne 2014 : Débroussaillage et petit abattage par le CFPPA.



La vue est entravée par les arbres depuis le chemin de croix.

Commune de Ganac

Objectifs

- Retrouver la vue à 360° vers la vallée de la Barguillère depuis le Peyrou.

Réalisation des travaux

- 33 % des propriétaires ont donné un avis favorable, soit 25 % de la surface engagée dans le projet.

Calendrier prévisionnel

Courant 2015 : Réalisation du chantier par le CFPPA après obtention des accords des propriétaires.



Les arbres cachent la vue vers la vallée de la Barguillère.

Commune de Goulier

Objectifs

- Aérer les abords du village, retrouver la vue vers les montagnes alentours.
- Redonner de la visibilité au village.

Réalisation des travaux

- 81 % des propriétaires font partie du chantier groupé, soit 67 % de la surface engagée dans le projet.

Calendrier prévisionnel

Automne 2014 : Abattage des arbres et nettoyage des parcelles par la COFOGAR et débardage animal.



Vue sur le village depuis le château de Montréal de Sos, photographie prise le 9 novembre 2013.

Commune d'Illier-et-Laramade

Objectifs

- Aérer les abords du village, retrouver une vue plus dégagée vers les montagnes alentours.
- Revoir le village depuis la route d'accès.

Réalisation des travaux

- 84 % des propriétaires ont donné un avis favorable, soit 81 % de la surface engagée dans le projet.

Calendrier prévisionnel

Courant 2015 : Réalisation du chantier après obtention des accords des propriétaires, intervenant à définir.



Le village est masqué par les arbres à l'entrée de bourg.

Commune de Lercoul

Objectifs

- Retrouver une vue dégagée vers les montagnes.
- Diminuer le risque incendie.

Réalisation des travaux

- 93 % des propriétaires font partie du chantier groupé, soit 92 % de la surface engagée dans le projet.

Calendrier prévisionnel

Automne 2014 : 1^{ère} phase de travaux par le CFPPA

Courant 2015 : 2^{ème} phase de travaux



Le dessous du village est particulièrement concerné par la problématique de réouverture paysagère.

Commune d'Orus

Objectifs


- Retrouver une vue dégagée vers les montagnes.
- Rendre visible le village depuis la vallée.

Réalisation des travaux

- 42 % des propriétaires ont donné un avis favorable, soit 51 % de la surface engagée dans le projet.

Calendrier prévisionnel

Courant 2015 : Réalisation du chantier après obtention des accords des propriétaires, intervenant à définir.

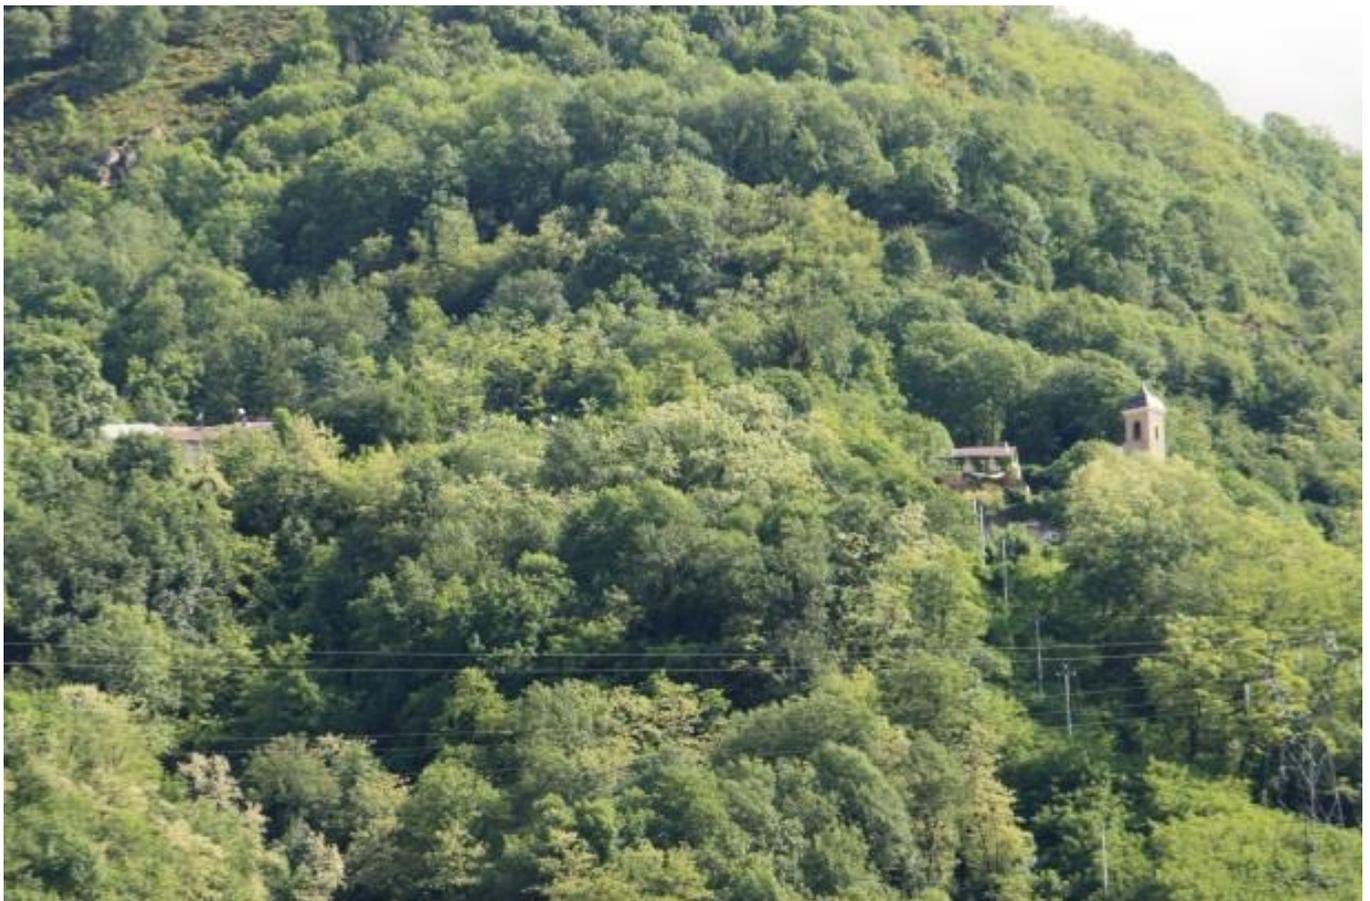

En été, le village est complètement masqué par la végétation, photographie prise depuis Vicdessos.

Commune de Sem

Objectifs


- Retrouver une vue dégagée vers la vallée et les montagnes.

Réalisation des travaux

- 67 % des propriétaires font partie du chantier groupé, soit 80 % de la surface engagée dans le projet.

Calendrier prévisionnel

Courant 2014 : Réalisation du chantier par un agriculteur de la commune.

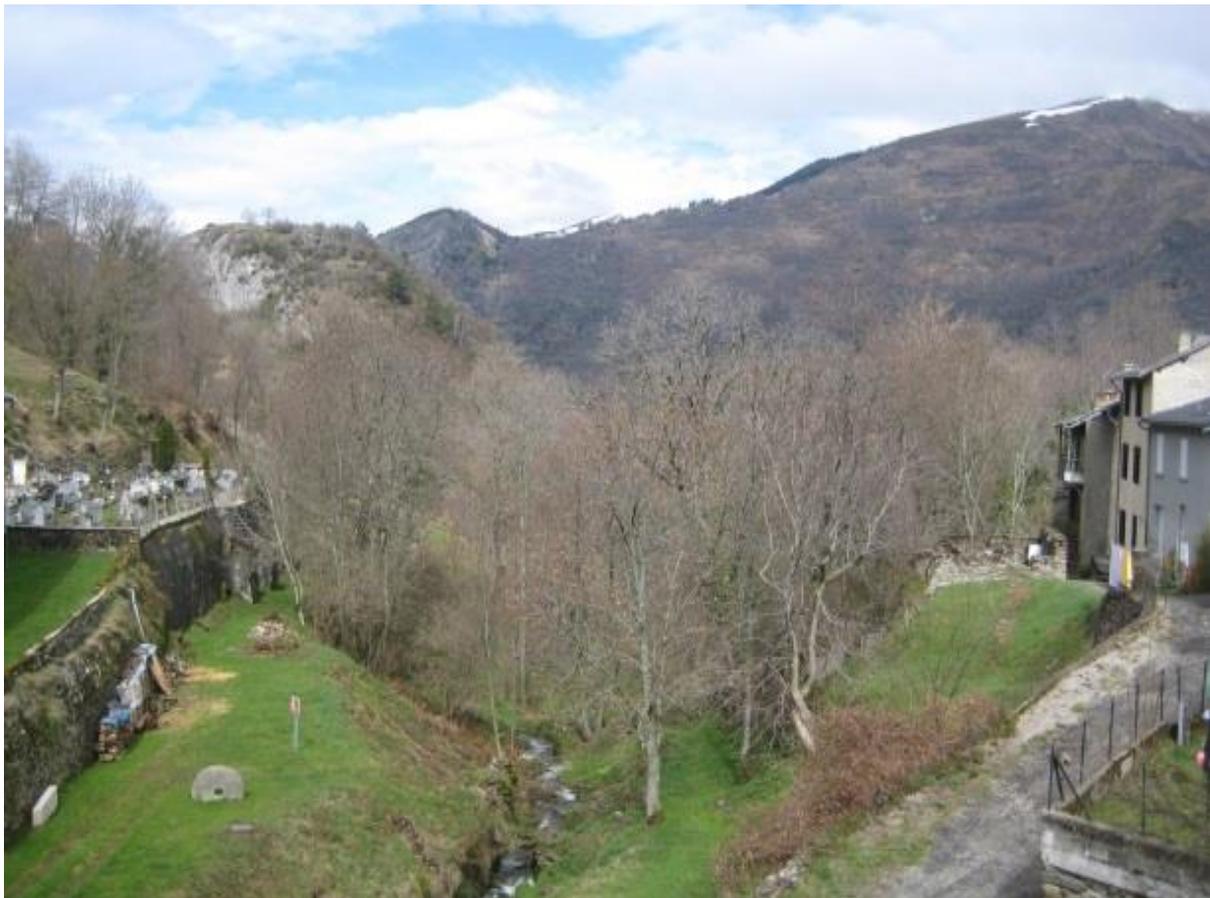

Les arbres masquent la vallée depuis le village.

Commune de Suc-et-Sentenac

Objectifs

- Retrouver une vue dégagée vers la vallée et les montagnes.
- Redonner au village une place dans le paysage.
- Diminuer le risque incendie.

Réalisation des travaux

- 68 % des propriétaires font partie du chantier groupé, soit 55 % de la surface engagée dans le projet.

Calendrier prévisionnel

Automne 2014 : 1ère phase de travaux.

Courant 2015 : 2ème phase de travaux.



Photographie prise depuis les hauteurs de Suc-et-Sentenac. © Nicolas Georges
